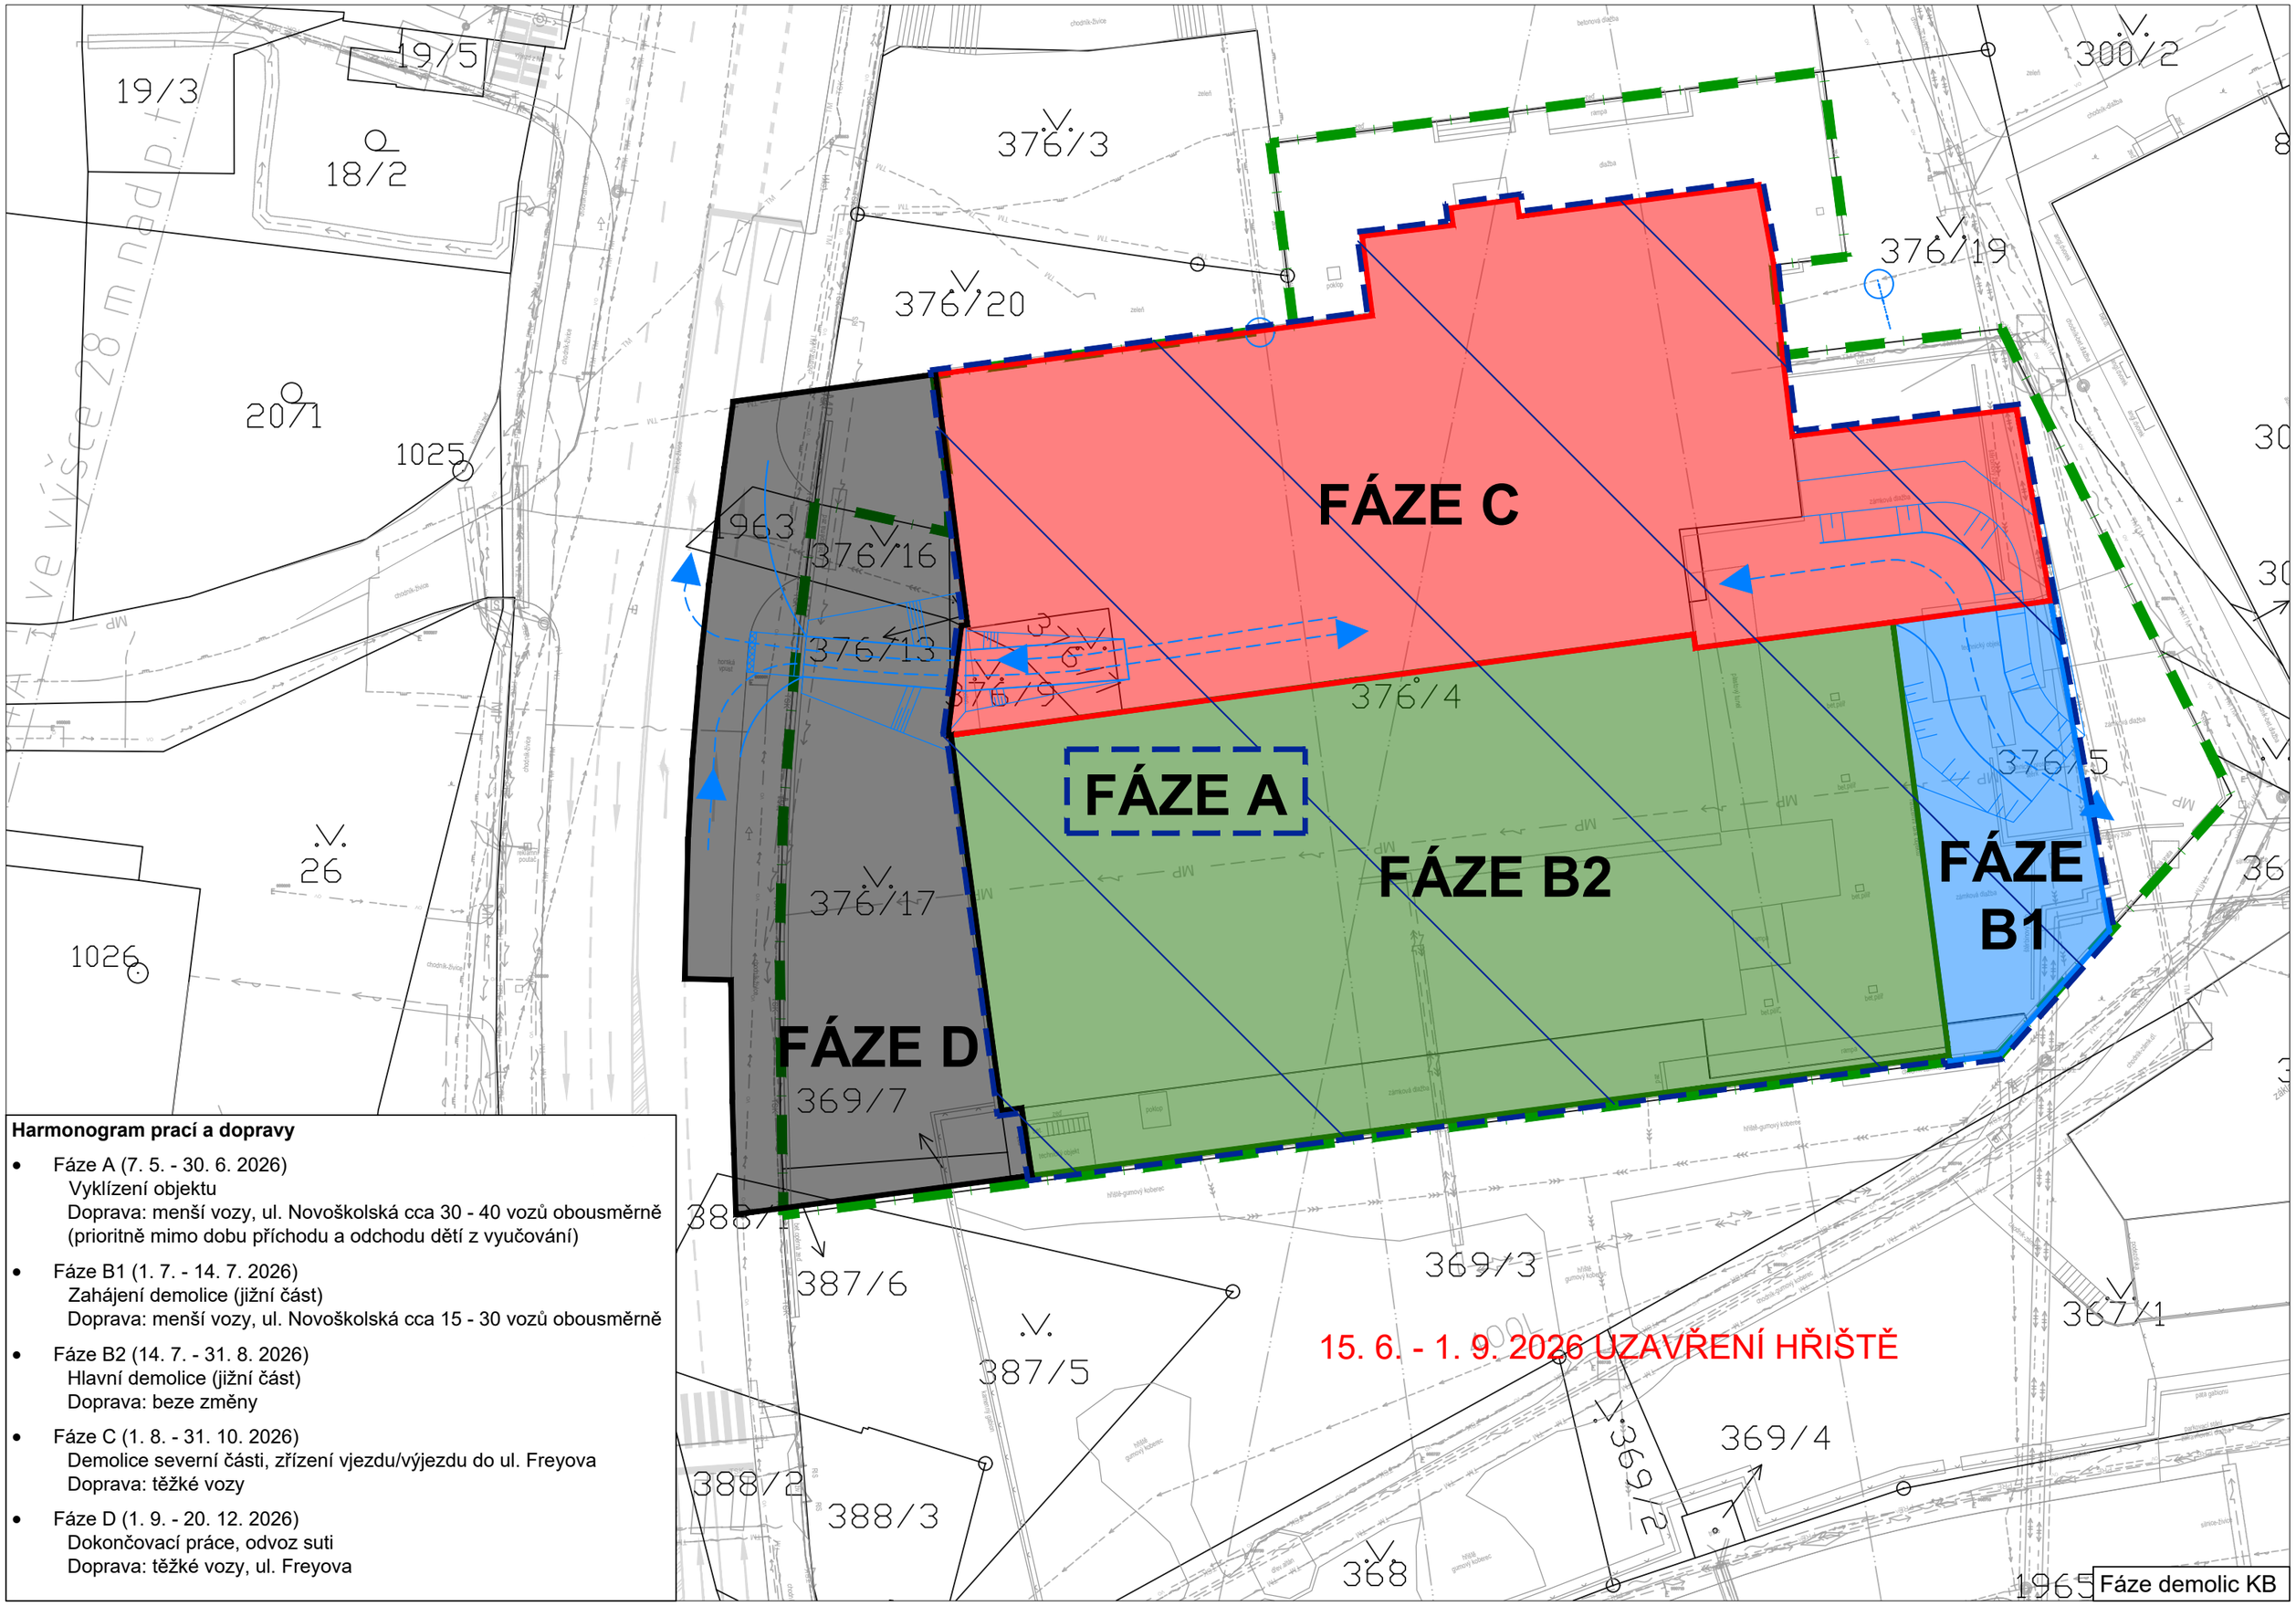

Harmonogram prací a dopravy

- Fáze A (7. 5. - 30. 6. 2026)
  Vyklízení objektu
  Doprava: menší vozy, ul. Novoškolská cca 30 - 40 vozů obousměrně
  (prioritně mimo dobu příchodu a odchodu dětí z vyučování)
- Fáze B1 (1. 7. - 14. 7. 2026)
  Zahájení demolice (jižní část)
  Doprava: menší vozy, ul. Novoškolská cca 15 - 30 vozů obousměrně
- Fáze B2 (14. 7. - 31. 8. 2026)
  Hlavní demolice (jižní část)
  Doprava: beze změny
- Fáze C (1. 8. - 31. 10. 2026)
  Demolice severní části, zřízení vjezdu/výjezdu do ul. Freyova
  Doprava: těžké vozy
- Fáze D (1. 9. - 20. 12. 2026)
  Dokončovací práce, odvoz suti
  Doprava: těžké vozy, ul. Freyova

Fáze demolic KB
